



# KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Yatırım Programı İzleme  
ve Değerlendirme Raporu

2021





**2020 Yılı**  
**Yatırım Programı İzleme ve**  
**Değerlendirme Raporu**

**Mart, 2021**

## İÇİNDEKİLER

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>1</b>
<b>I. YÖNETİCİ ÖZETİ</b>	<b>2</b>
<b>II. GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>3</b>
II.A.Misyon	3
II.B. Vizyon	3
II.C. Değerler	3
II.D. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	4
II.E.Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	6
II.F.Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	8
II.G.2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
<b>III. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI</b>	<b>17</b>
III.A. Devam Eden Projeler	17
III.B. Tamamlanan Projeler	19
<b>IV. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR</b>	<b>30</b>
<b>V. ÖNERİLER</b>	<b>31</b>
<b>EK 1 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI GERÇEKLEŞME RAPORU</b>	<b>32</b>



## I. Yönetici Özeti

Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya arasında bilgi, teknoloji ve kültür aktarımının gerçekleştiği köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik coğrafyasında, 1992 yılında kurulmuş olup, çağdaş Türkiye'nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ders içerikleri düzenlenmekte, diploma eki verilmesi gibi hazırlıklar ve çalışmalar yapılmakta, hızla ilerlemeler kaydedilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi; öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversitelerine uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemiz, yeni yerleşkesine taşınmasından itibaren hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelmiş olup, nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye'nin 21. yüzyılda daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaya devam etmektedir.

2020 yılı yatırım ödenekleri; ağırlıklı olarak, ödenek yetersizliği nedeniyle öncelikli ve yapımı devam eden projelerimize yönlendirilmek suretiyle, "Yerleşke"nin bir an önce tam anlamıyla hayata geçirilmesi amaçlanmış, yeni alanların planlanmasına ise yıllık ödenek imkanları ölçüsünde, önümüzdeki (2021 / 2022 / 2023) yıllara bırakılmıştır. Türkiye'deki imalat sanayinin önemli bir yüzdesini kapsayan ilimizde sanayi ile birçok çalışma başlatılmıştır. Aynı zamanda Üniversitemiz Teknopark'ında çok sayıda AR-GE şirketi ile teknolojik ürünlere yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün Umuttepe'de yaklaşık 778 hektarlık yapılaşma alanı olan Ülkemizin her türlü yeterlilik ve altyapıya sahip en güzel yerleşkelerinden biri kurulmuştur. Üniversitemiz 336.793 m<sup>2</sup>'si Umuttepe yerleşkesinde olmak üzere toplam 509.392 m<sup>2</sup> kapalı alanda yaklaşık 71.000 öğrenciye, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermekte, gittikçe büyüyen ve gelişen bir bilgi merkezi olmaktadır. Araştırma ve Uygulama Hastanemizde toplam 795 yatak kapasiteli pedikatrik ve yetişkin yoğun bakım üniteleri ile hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılanmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, gerek teknik yönden, gerek uygulanabilirlik yönünden Üniversitemizin bütün faaliyet alanlarında çalışma arkadaşlarımla birlikte daha ileriye gidileceğine inanıyor ve güveniyorum.

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Rektör

## II. Genel Deęerlendirme

### II.A.Misyon

- ❖ Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,
- ❖ Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,
- ❖ Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

### II.B. Vizyon

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite-sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

### II.C. Deęerler

- ❖ Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık,
- ❖ Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık,
- ❖ Akademik özgürlük,
- ❖ Çevreye ve insan haklarına saygı,
- ❖ Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek,
- ❖ Şeffaf ve hesap verilebilirlik,
- ❖ Katılımcı yönetim anlayışı,

## **II.D. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri**

### ***STRATEJİK AMAÇ 1***

#### **Eğitim-Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi**

##### **Stratejik Hedef 1.1 (2019-2023)**

Başarılı Öğrencilerin Üniversitemize Kazandırılması

##### **Stratejik Hedef 1.2 (2019-2023)**

Eğitim Programlarımızın Zenginleştirilmesi

##### **Stratejik Hedef 1.3 (2019-2023)**

Ulusal ve Uluslar arası Görünürlüğümüzün Artırılması

##### **Stratejik Hedef 1.4 (2019-2023)**

Öğretim Elemanı Sayısının ve Niteliğinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 1.5 (2019-2023)**

Eğitim-Öğretim Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi

### ***STRATEJİK AMAÇ 2***

#### **Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi**

##### **Stratejik Hedef 2.1 (2019-2023)**

Bilimsel Araştırma Proje Sayılarının Artırılması

##### **Stratejik Hedef 2.2 (2019-2023)**

Yayın Sayısının ve Niteliğinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 2.3 (2019-2023)**

Bilimsel Araştırma Kalitesinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 2.4 (2019-2023)**

Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi

### ***STRATEJİK AMAÇ 3***

#### **İnsan Kaynaklarının ve Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi**

##### **Stratejik Hedef 3.1 (2019-2023)**

Üniversite Personelinin Çalışma Motivasyonunun Yükseltilmesi

##### **Stratejik Hedef 3.2 (2019-2023)**

Üniversite Mezunları ve Öğrencileri İle İletişiminin Güçlendirilmesi

##### **Stratejik Hedef 3.3 (2019-2023)**

Yönetim Sistemlerinin Etkinleştirilerek Üniversitenin Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi

##### **Stratejik Hedef 3.4 (2019-2023)**

Kurum Kültürünün ve Yenilikçiliğin Yaygınlaştırılması

##### **Stratejik Hedef 3.5 (2019-2023)**

Personelin Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi

### ***STRATEJİK AMAÇ 4***

#### **Girişimcilik Bağlamında Sanayi İle İşbirliğinin, Topluma Sunulan Hizmetlerin ve Diğer Dış Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi**

##### **Stratejik Hedef 4.1 (2019-2023)**

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmet Kapasitesinin Artırılması /Kurumsallaştırılması

##### **Stratejik Hedef 4.2 (2019-2023)**

Üniversite-Sanayi Arasında Gerçekleştirilecek Ar-Ge Proje /Sözleşme Kapasitesi Etkinliğinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 4.3 (2019-2023)**

Sağlık Hizmetlerinin Kapasitesinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 4.4 (2019-2023)**

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması

##### **Stratejik Hedef 4.5 (2019-2023)**

Üniversitenin Dış Paydaşlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi

## STRATEJİK AMAÇ 5

### Üniversitemiz Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi

#### Stratejik Hedef 5.1 (2019-2023)

Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Altyapı ve Fiziki Olanaklarının İyileştirilmesi

#### Stratejik Hedef 5.2 (2019-2023)

Rektörlük Ek Bina İnşaatının Tamamlanması

#### Stratejik Hedef 5.3 (2019-2023)

Dış Hekimliği Ek Eğitim Binası İnşası

### II.E.Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, Özel Bütçeli bir kurumdur.


Gelirlerimiz; Hazine Yardımı, Öz Gelirler, Döner Sermaye Gelirleri ve Bütçe Dışı Kaynaklardan oluşmaktadır.

*Tablo1: Ekonomik Düzeyde Yatırım Harcamaları*

Ekonomik kodu	Tertip	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	11.513.000,00	13.910.000,00	2.598.000,00	20.305.000,00	20.163.593,51
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.042.822,52
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.902.000,00	2.898.000,00	16.700.000,00	5.100.000,00	5.065.794,33
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.500.000,00	9.117.000,00	190.000,00	13.427.000,00	11.182.793,47
Toplam		36.415.000,00	25.925.000,00	19.788.000,00	40.032.000,00	37.455.003,83

*Tablo 2: Sektörel Bazda Yatırım Harcamaları*

	Eğitim	Sağlık	Spor	Teknolojik Araştırma	Toplam
Özel Bütçe	14.833.918,39	19.706.085,44	0,00	2.915.000,00	37.455.003,83
Döner Sermaye	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>14.833.918,39</b>	<b>19.706.085,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>37.455.003,83</b>

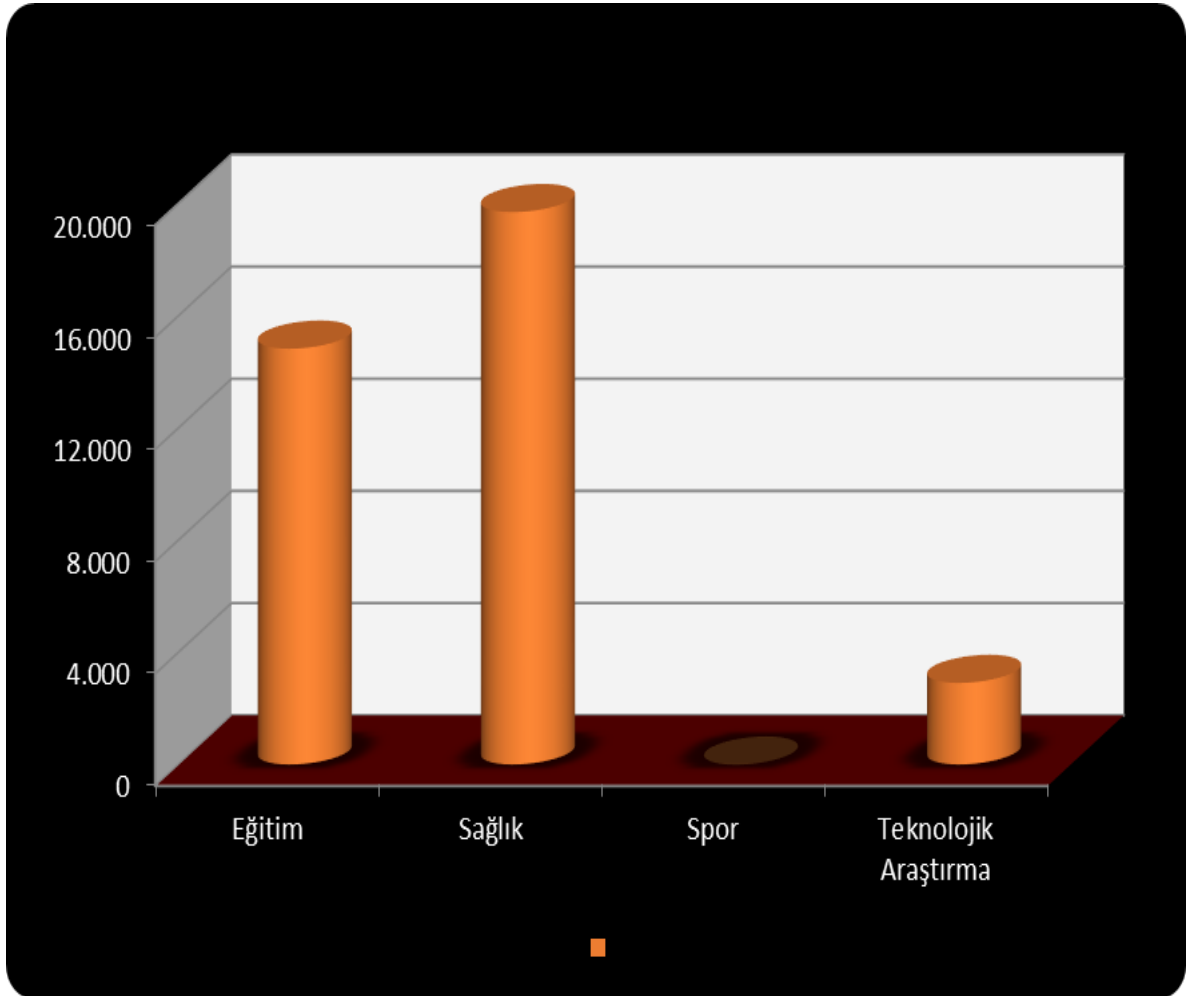

## II.F.Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede; 4 Enstitü, 18 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 42 birimde akademik faaliyet göstermektedir. 71.081 öğrenciye önlisans, lisan, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.

Yeni Araştırma Merkezleri Hizmet Binası 10.500 m<sup>2</sup> kapalı alanda Eylül 2019 tarihi itibarıyla hizmete açılmış olup, Binamızda Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antikor Üretim Laboratuvarı, Tıbbi Genetik Laboratuvarı (Tıbbi Genetik ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı), Proteomiks Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı (KÖGEM), Kök Hücre ve Doku Yenilemesi Anabilim Dalı) hizmet vermektedir.

DeneySEL Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB) Kocaeli Üniversitesi senato kararıyla 1999 yılında kurularak, 2006 yılında Umuttepedeki 500 metrekarelik prefabrik binada hizmete başlamış olup, 2019 yılında tamamlanan 2.342 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni hizmet binasında faaliyetlerine devam etmektedir. Marmara Bölgesinde ilk ruhsat alan Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (18.12.2007) olan Birimiz bünyesinde farklı alanlarda çalışmaların yürütülebilmesine olanak sağlayacak farklı donanımlarda, İzole Organ Araştırma Laboratuvarı, Davranış Araştırma Laboratuvarı, Elektrofizyoloji Araştırma Laboratuvarı, Genel Araştırma Laboratuvarı, Özel Laboratuvar (Transgenik Hayvan Araştırma ve Biyogüvenlik Laboratuvarı) 5 laboratuvarı bulunmaktadır.

Laboratuvarlar dışında birimiz kapsamında, 2 adet Basit Girişim Odası, Anestezi ve Reanimasyon Odası, 2 adet Ameliyathane, Tıbbi İlaç ve Malzeme Odası ve Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Ünitesi Operasyonel Alanları yer almaktadır. Fare, Sıçan, Kobay ve Tavşan Bakanlık tarafından ruhsat alınan türlerdir. Bu kapsamda, Araştırmaya Yetkili Kuruluş izni alınmış; Transgenik Sıçan, Transgenik Fare ve Nude Fare gibi modeller üzerinde IVC Kafes sistemi kullanılarak çalışmalar yapılabilecektir. DETAB'da Temel biyolojik araştırmalar, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik alanlarını ilgilendiren ürün ve cihazların araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, yeni ilaç moleküllerinin veya bitkisel ürünlerin etkilerinin araştırılması klinikte kullanılan ilaçların farklı indikasyonlarda, kardiyovasküler hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, kanser araştırmaları, cerrahi çalışmalar, mikrocerrahi çalışmalar, kök hücre araştırmaları, sistemik toksisite çalışmaları yapabilecek kapasitededir.

2020 Yılında 2020K12-15192 Nolu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gelir gerçekleşmesine göre kabul edilen 129 adet yeni projenin yanı sıra önceki

yıldan devam eden 260 adet projeye birlikte toplam 389 adet proje yürütülmekte olup, 111 adedi yılı içerisinde tamamlanmıştır. Diğer 278 projenin yürürlüğü devam etmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin verdiği sağlık hizmetleri; 1994 yılında SSK hastanesi ile ortak kullanılan hastane binasında hizmete girmiş ve 20 Haziran 2005 tarihi itibarıyla Hastanemiz Derince'deki prefabrik binalardan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içindeki modern binasına taşınmıştır.

İnşaatında ilk kez sismik izolatör kullanılan hastanemiz Ana Bina İnşaatı Türkiye'de bu teknik ile inşa edilen ilk hastane olma özelliğini taşımaktadır. Hastane 256 adet lastik izolatör üzerinde durmaktadır. Deprem anında izolatör sayesinde 40'ar santimetre sağa ve sola hareket edebilen binanın diğer örnekleri sadece Amerika ve Japonya'da bulunmaktadır. İnşaatında 2.700 ton çelik kullanılan hastanede, ısıtma ve soğutma işlemleri hijyenik klimalarla yapılmaktadır. İzolatörler sayesinde 9 şiddetindeki bir depreme bile dayanıklı yapılmıştır. Tüm bina otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Hastanemiz en son teknolojiye uygun olup yatak sayımız 807 dir. Pediatrik ve erişkin yoğun bakım üniteleri hepa filtreli hijyenik havalandırma sistemi ve en son teknolojiye uygun cihazlarla donatılmıştır. Laminar flow havalandırma sistemi kullanılan ameliyathanemizin, hijyenik antimikrobiyal CTP panel kaplama ile tüm tavan ve duvarları kaplatılmıştır.

Ameliyathanelerden bilimsel aktiviteler için ses ve görüntü sistemleri ile konferans salonuna görüntü aktarabilmektedir. Acil Servis, Kardiyoloji, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Psikiyatri, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkoloji, Ameliyathaneleri, Adli Tıp, Patoloji, Nükleer Tıp, Kemoterapi Ünitesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Tüp Bebek Ünitesi, Kemik İliği Nakil Ünitesi, Yanık Ünitesi, Endoskopi Üniteleri, Kan Merkezi, Merkez Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı, Kök Hücre, Uyku Laboratuvarı, PET-CT Laboratuvarı ve diğer alanlarda tıbbın son gelişmiş teknikleriyle hastalara müdahale edilmektedir.

Data sistemiyle poliklinikler, hasta yatak odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, doktor ve hemşire odaları gibi her noktadan hasta bilgilerine ulaşmak mümkündür. 2012 yılından itibaren İnternet ve Telefonla Randevu sistemi hizmete sokularak daha kaliteli bir hizmet sunulmaya başlanmıştır Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinden 2015 yılında 82 puan, 2016 yılında 83,61 puan, 2017 yılında 89,44 puan ve 2018 yılında 93,63 puan, 2019 yılı değerlendirmesinde 93,39 puan almış bulunmaktayız. 2017 Haziran

ayından itibaren laboratuvar, patoloji, radyoloji sonuçlarının çıktığına dair hastalarımız cep telefonlarına SMS atılmaya başlanmıştır.

2017 yılında Sağlık Turizmi çalışmaları başlatılmış olup, 2018 de Sağlık Turizmi kapsamında hasta alımına başlanmıştır. 2018 yılı itibarı ile Türkiye’de ilk kez Devlet Üniversitesi olarak HİMSS 6 standardını kazandık. 2019 yılsonu itibari ile poliklinik ek binamızın % 98’i tamamlanmıştır. 2019 yılında 110 yataklı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezimiz hizmete açılmıştır. Ana binadaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisimiz daha önce Morfoloji binası olarak adlandırılan binaya klinik ve poliklinikleri ile taşınarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak faaliyete alınmaktadır. Aynı binada daha tekamüllü Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Alerji poliklinikleri açılmıştır. Poliklinik ek binamız 2019 yılı sonu itibari ile fiziken bitmiş olup 2020 yılının 6. ayında faaliyete geçmiştir.

2020 yılında eski poliklinik hizmet alanımız düzenlendi, kafeterya alanı oluşturuldu, kafeterya hizmete başladı. Eski bina ve yeni poliklinik alanı arasında geçişlerin hava şartlarından etkilenmemesi amaçlı sundurma yapılmıştır. Boşalan kafeterya alanı Acil servis ve Radyoloji bölümlerini genişletilmek üzere planlandı. Üniversite Vakfına yapılan bağışlar ile 7 özel oda düzenlemesi tefrişatı yapılmıştır. Acil Servise 3 adet temas izolasyonu kabini yapıldı. Yeni bir tomografi cihazı alındı. Ayrıca onkoloji binasında tomografi cihaz oda inşaatı başlatıldı. İnme merkezimize yoğun bakım hijyenik ortamının sağlanması amaçlı 1 adet aseptizör alımı yapıldı. Bunun yanında Acil-Ambulans ile full otomatik endoskop yıkama makinesi alımı yapıldı, hizmete sunuldu.

*Tablo 3: Taşınmaz ve Kapalı Alanların Dağılımı*

Yerleşkeler	Taşınmaz Alanların Dağılımı (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alanların Dağılımı (m <sup>2</sup> )
UMUTTEPE	778.466,00	336.793,00
ANITPARK	7.474,00	14.143,01
ARSLANBEY	610.315,00	21.648,99
HEREKE	38.203,00	19.262,99
DEREKÖY-KARAMÜRSEL	10.953,00	10.905,01
DERBENT	48.123,00	13.536,00
ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR-KULLAR	44.674,00	22.905,99
YAHYA KAPTAN	5.055,00	1.884,00
DEĞİRMENDERE	9.357,00	1.581,00
KANDIRA	8.198,00	7.112,01
KÖRFEZ	12.700,00	20.056,00
YUVACIK	20.499,00	8.780,00
UZUNÇİFTLİK	20.627,00	3.416,00
TEKNOPARK-YENİKÖY	114.068,00	12.763,00
GÖLCÜK	5.958,00	5.634,00
FORD OTOSAN İHSANİYE	4.600,00	6.180,00
KARTEPE	26.354,00	2.790,99
<b>Toplam</b>	<b>1.765.624,00</b>	<b>509.391,99</b>

**Tablo 4: Yıllara Göre Hastane İstatistikleri**

İstatistikler	2018	2019	2020
Hasta Yatak Sayısı*	727	727	795
Yatak Kullanım Oranı	76,88	78,84	52,62
Ortalama Yatış Gün Sayısı	6	5,7	5,1
Yatırılan Toplam Hasta Sayısı	34.591	36.749	33.770
Ölen Hasta Sayısı**	604	549	592
Poliklinik Muayene Sayısı	790.030	840.363	655.860
Ameliyat Sayısı	36.430	37.580	27.027
Doğum Sayısı	956	919	795
Kanser Bildirimi	1.859	2065	2005

\* Sağlık Bakanlığı onaylı yatak sayısıdır. İdare Faaliyet raporunda verilen rakamlar Covid-19 pandemisi nedeniyle arttırılan yatak sayılarını da içermektedir.

\*\* Adli vakalar dâhil

4.055 m<sup>2</sup> kullanım alanında hizmet veren kütüphanemizin 450 kişilik oturma kapasitesi bulunmakta olup, 80 adet internet bağlantılı bilgisayar, 119.676 adet kitap, 437.855 adet e-kitap, 1.097 adet basılı dergi, 68.079 adet e-dergi (tam metin), 1572 diğer (kitap dışı) kütüphane kaynakları bulundurarak öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize imkanları dahilinde en iyi hizmeti vermektedir.


**Tablo 5: Kütüphane Kaynakları**

Kütüphane Kaynakları	Adet
Kitap (basılı)	119.676
Kitap (braille)	163
Dergi (basılı)	1.097
Tez(basılı)	4.556
Kitap Dışı	1.572
E-dergi (tam metin)	68.079
E-kitap	437.855
E-tez (tam metin)	2.626.291
<b>Toplam</b>	<b>3.259.289</b>

Üniversitemizde yıllara göre öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayılarına ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir.


**Tablo 6: Öğrenci Sayıları**

Öğrenci Sayıları			
Birimin Adı	2018	2019	2020
Fakülteler	39.112	40.744	42.189
Yüksekokullar	3.204	2.491	1.665
Enstitüler	6.037	5.268	6.371
Meslek Yüksekokulları	24.110	22.632	20.856
<b>Öğrenci Sayısı</b>	<b>72.463</b>	<b>71.135</b>	<b>71.081</b>




*Tablo 7: Akademik Personel Sayıları*

<b>Akademik Personel</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Profesör</b>	<b>257</b>	<b>284</b>	<b>306</b>
<b>Doçent</b>	<b>203</b>	<b>213</b>	<b>224</b>
<b>Dr. Öğr. Üyesi</b>	<b>490</b>	<b>486</b>	<b>471</b>
<b>Öğretim Görevlisi</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>462</b>
<b>Araştırma Görevlisi</b>	<b>636</b>	<b>714</b>	<b>665</b>
<b>Toplam</b>	<b>2.046</b>	<b>2.162</b>	<b>2.128</b>



**Tablo 8: İdari Personel Sayıları**

<b>İdari Personel Kadro Doluluk Durumu (Kadrolu-Sözleşmeli -Sürekli İşçi Pozisyonu)</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Genel İdari Hizmetler</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>627</b>
<b>Sağlık Hizmetleri</b>	<b>639</b>	<b>633</b>	<b>623</b>
<b>Teknik Hizmetler</b>	<b>177</b>	<b>191</b>	<b>194</b>
<b>Eğitim ve Öğretim Hizmetleri</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Avukatlık Hizmetleri</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Din Hizmetleri</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Yardımcı Hizmetler</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
<b>Sözleşmeli</b>	<b>-</b>	<b>353</b>	<b>477</b>
<b>Sürekli İşçi</b>	<b>-</b>	<b>1.252</b>	<b>1.358</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.606</b>	<b>3.197</b>	<b>3.392</b>

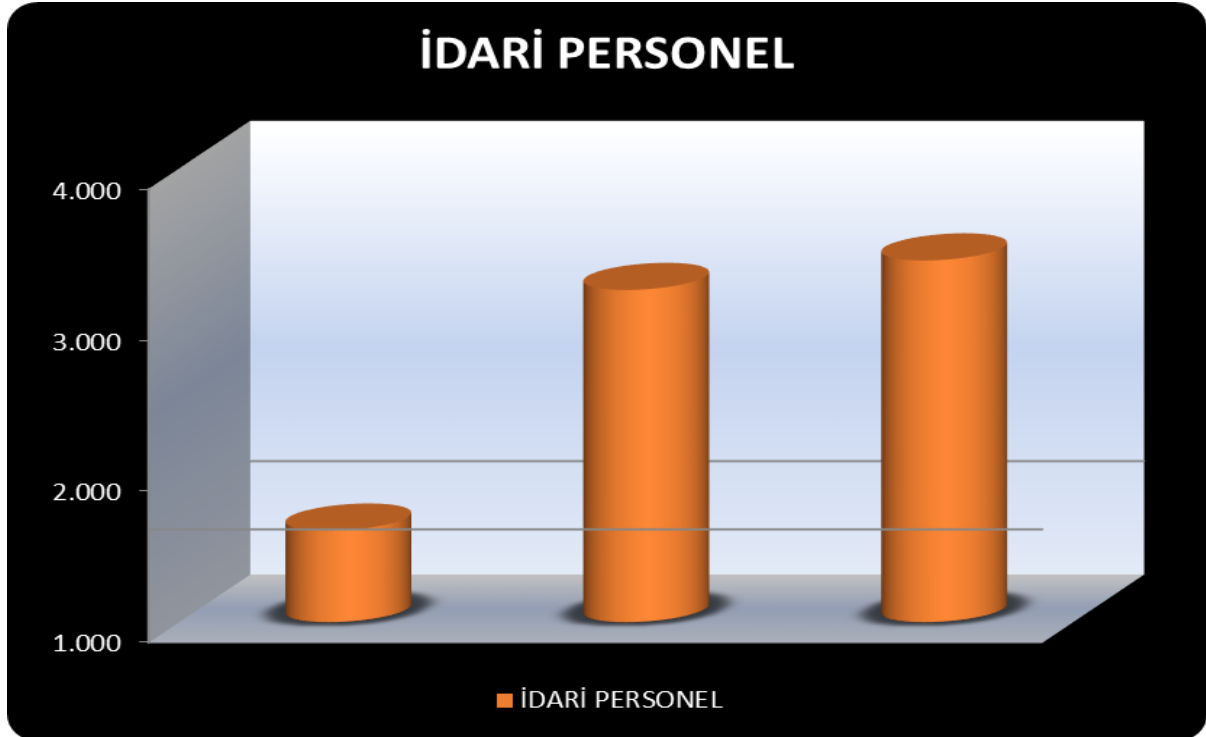

## **II.G.2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında toplam 9 adet projesi bulunmaktadır. Projelerin 2020 KBÖ toplamı 36.415.000,00 TL'dir. Yatırım programında yer alan projelerden 5 adedi eğitim sektöründe, 2 adedi sağlık sektöründe ve 2 adedi teknolojik araştırma projeleri sektöründe yer almaktadır. Yılsonu itibariyle yılı ödeneği yapılan eklemelerle toplam 40.032.000,00 TL olup, bu ödeneğin 37.455.003,83 TL'si giderleştirilmiştir.

Mevcut projelerimiz, Muhtelif İşler (Eğitim), Yayın Alımı, Muhtelif İşler (Sağlık), Poliklinik Ek Bina, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Rektörlük Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri, Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Projeleri, Derslikler ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapısı olup yılı içerisinde proje işlemleri gerçekleşmiştir.

### III. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

#### III.A. Devam Eden Projeler

##### 1. Proje No : 2020H03-150815

Proje Adı : Kampüs Altyapısı

Proje başlangıç ödeneği 2.000,00 TL olup 1.999.986,41 TL harcama yapılmıştır.

<b>PROJE NO</b>	<b>2020H03-150815</b>
<b>PROJE ADI</b>	<b>KAMPÜS ALTYAPISI</b>
Sektör/Altsektör	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol,Knl.Hattı, Peyzaj,Su, Telefon Hattı
Projenin Yılı	2020-2022
Projenin Toplam Tutarı	
Yılı Başlangıç Ödeneği	2.000,00
Eklene	1.998.000,00
Aktarılan	-
Düşülen	-
<b>Toplam Ödenek</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>HARCANAN</b>	<b>1.999.986,41</b>
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Diğer Açıklamalar	Güney Kesim Altyapı İnşaatı ihalesi yapılmış ve ödenek dahilinde imalat gerçekleştirilmiştir.

## 2. Proje No: 2008H03-151874

### Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin başlangıç ödeneği 1.100.000,00 TL olup, yıl içerisinde 900.000,00 TL ilave ödenek sağlanarak proje tutarı 2.000.000,00 TL'ye yükseltilmiştir. Yıl içinde ödeneğin 1.999.030,62 TL'si harcanarak projenin nakdi ve fiziki gerçekleşmesi % 99,95'i bulmuştur.

<b>PROJE NO</b>	<b>2008H03-151874</b>
<b>PROJE ADI</b>	<b>DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER- ÖĞRENCİ EVİ(761m2)</b>
Sektör/Altsektör	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
Projenin Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Arttırmak
Projenin Yeri	Kocaeli
Karakteristiği	Sosyal Donatı(761 m2)- Sosyal Donatı(761 m2)
Projenin Yılı	2008-2021/ Öğrenci Evi(2020-2021)
Projenin Toplam Tutarı	2.000.000,00
Yılı Başlangıç Ödeneği	1.100.000,00
Eklene	900.000,00
Aktarılan	-
Düşülen	-
<b>Toplam Ödenek</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>HARCANAN</b>	<b>1.999.030,62</b>
Nakdi Gerçekleşme	%99,95
Fiziki Gerçekleşme	%99,95
Diğer Açıklamalar	Öğrenci Evi İnşaatı ihalesi yapılmış ve ödenek dahilinde imalatları gerçekleştirilmiştir.

### III.B. Tamamlanan Projeler

1. Proje No : 2020H03-151143 (Eđitim Sektörü)  
Proje Adı : Muhtelif İşler

#### 1-Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiđi

Yıllık proje kapsamında Büyük Onarım Hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneđi 4.000.000,00 TL dir. Projeye toplam 3.999.951,09 TL lik harcama yapılmış olup, nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 100'dür.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
Proje No	2020H03-151143				Yatırım Programına Alınış Deđerleri	Revize Edilmiş Son Deđerler
Proje Adı	Muhtelif İşler				4.000.000,00	4.000.000,00
Sektör/Altsektör	EĐTİM-YÜKSEKÖĐRETİM					
Proje Amacı	Bakım-Onarım					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiđi	Bakım-Onarım					
Fiziki hedef	%100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		4.000.000,00	-		4.000.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		3.999.951,09			3.999.951,09	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli olan büyük onarım ihtiyaçlarının giderilmesi sonucunda eğitim ve öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eđitimde Hizmet Kalitesinin Arttırılması.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüđü	Tüm yerleşkelerde bulunan binalarımızın aciliyet durumu gözetilerek büyük onarımı tahsis edilen bütçe çerçevesinde yapılmıştır. Daha önce defalarca tekrarlanan; her birimde acil müdahale gerektirecek arızaların giderilmesine yönelik birimlerde teknik personel bulundurulması ve aktif olarak görevlendirilmeleri önem arz etmektedir.					
Geleceđe İlişkin Çıkarılan Dersler	2021 Yatırım Programı Çerçevesinde Cari Giderler Belirlenerek Proje Kapsamında Yatırım Ödeneđi Talep Etmek.					

## 2-Makine Teçhizat Karakteristiđi

Makine Teçhizat alımlarına 5.098.000,00 TL bařlangıç ödeneđi ayrılmıřtır.2.598.000 ,00 TL si ihtiyaç önceliđi göz önüne alınarak aynı sektörde bařka projelere aktarılmıřtır. Projede toplam 2.496.458,98 TL lik harcama yapılarak ödeneđin %100'ü kullanılmıřtır.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
Proje No	2019H03-151143				Yatırım Programına Alınıř Deđerleri	Revize Edilmiř Son Deđerler
Proje No	2019H03-151143				5.098.000,00	2.500.000,00
Proje Adı	Muhtelif İřler					
Sektör/Altsektor	EĐİTİM-YÜKSEKÖĐRETİM					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiđi	Makine-Teçhizat					
Fiziki hedef	% 100					
Bařlama ve Bitiř Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleřme Tarihi			Sözleřme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dıř	Toplam	Kamuřlařtırma	Dıř	Toplam	Kamulařtırma
		2.500.000,00			2.500.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dıř	Toplam	Kamuřlařtırma	Dıř	Toplam	Kamulařtırma
Programa Alındıđı Yıl (2020)		2.496.458, 98			2.496.458, 98	
Karřılařılan Sorunlar, Getirilen Çözüm, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerçekleřen makine teçhizatın tam ve zamanında sađlanması sonucunda Eđitim ve Öđretim Hizmetinin aksamadan yürütülmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İliřkisi ve Katkısı	Eđitimde Hizmet Kalitesinin Arttırılması.					
Yapılan İřler, Uygulamada Karřılařılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüđü	2020 yılı proje uygulamaları makine ve teçhizat projesi bazında birimlerin talepleri dođrultusunda, 2346 adet mefruřat (masa, sandalye, dolap, sıra, perde vb), 565 adet laboratuvar malzemesi (eđitim-deney setleri, ölçüm cihazları vb. ), 3739 adet makine teçhizat ( kesintisiz güç kaynađı, fotokopi makinası vb.) ve 53 kalem elektronik malzeme ( kamera sistemi, televizyon vb.) alımı gerçekleştirilmiřtir.					
Geleceđe İliřkin Çıkarılan Dersler	2021 yatırım programı çerçevesinde cari giderler belirlenerek proje kapsamında yatırım ödeneđi talep etmek.					

### 3-Bilgi Teknolojileri Karakteristiđi

Biliřim alt yapısı iin, bilgisayar, yazılımı, lisans ve benzeri alımlar iin 1.500.000,00 TL bařlangı deneđi ayrılmıřtır. Yıl iinde dođan eřitli ihtiyaları karřılamak iin 300.000,00 TL dūřlerek toplam denek 1.200.000,00TL olmuřtur. deneđin % 86,90'ı kullanılmıřtır.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
				Yatırım Programına Alınıř Deđerleri		Revize Edilmiř Son Deđerler
Proje No	2020H03-151143			1.500.000,00		1.200.000,00
Proje Adı	Muhtelif İřler					
Sektr/Altsektr	EĐİTİM-YKSEKĐRETİM					
Proje Amacı	Bilgi ve İletiřim Teknolojileri					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiđi	Bilgi Teknolojileri					
Fiziki hedef	% 100					
Bařlama ve Bitiř Tarihi	2020-2020					
Proje Szleřme Tarihi				Szleřme İhale Bedeli		
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dıř	Toplam	Kamuřlařtırma	Dıř	Toplam	Kamulařtırma
		1.200.000,00			1.200.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dıř	Toplam	Kamuřlařtırma	Dıř	Toplam(*)	Kamulařtırma
Programa Alındıđı Yıl (2020)		1.042.822,52			1.042.822,52	
Karřılařılan Sorunlar, Getirilen zmler, ıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli olan bilgisayar donanımlarının tam ve zamanında sađlanması sonucunda Eđitim ve đretim Hizmetinin aksamadan yrtlmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektrel Plan Hedefleriyle İliřkisi ve Katkısı	Eđitimde hizmet kalitesinin arttırılması.					
Yapılan İřler, Uygulamada Karřılařılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl zldđ	2020 yılı proje uygulamaları biliřim alt yapısı ve bilgisayar bazında 155 adet masast bilgisayar, 86 adet dizst bilgisayar, 45 adet yazıcı, 1 adet veri depolama diski alımı gerekleřtirilmiřtir. 2020 yılı proje uygulamaları bilgisayar yazılımı ve lisans bazında 1 adet SSL Sertifika Yazılımı, 1 adet Faaliyet Kurtarma ve Repikasyon Gncelleme Yazılımı, 1 adet Ađ Gvenlik Gncelleme Yazılımı, 1 adet Merkezi Elektronik Mesajlařma AntiSpam Sistemi Gncelleme Yazılımı, 1 adet Sanallařtırma Gncelleme Yazılımı, 3 adet Veri Depolama Gncelleme Yazılımı, 1 adet Yedekleme Gncelleme Yazılımı ve 1 adet Network İzleme Sistemi Gncelleme Yazılımı, 1 adet insan kaynakları ynetimi yazılımı, 1 adet E-devlet entegrasyon modl alımı, 321 adet Tbitak Nes alımı, yazılımı, 45 adet Ebys Bakım ve Destek Hizmetleri alımı gerekleřtirilmiřtir.					
Geleceđe İliřkin ıkarılan Dersler	2021 yatırım programı erevesinde cari giderler belirlenerek proje kapsamında yatırım deneđi talep etmek.					

**2. Proje No : 2020H03-151135(Eğitim-Yükseköğretim Sektörü)****Proje Adı : Yayın Alımı**

2020 yılında yayın alımları için 3.000.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmış ve 2.997.276,27 TL si harcanmıştır. Yıl içinde ödeneğin % 99' u kullanılmıştır.

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
				Yatırım Programına Alınmış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2020H03-151135			3.000.000,00	3.000.000,00	
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM					
Proje Amacı	Yayın Alımı					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Yayın Alımı					
Fiziki hedef	% 100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		3.000.000,00			3.000.000,00	
<b>Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama</b>						
Cari Fiyatlarla			2020Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		2.997.276,27			2.997.276,27	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kalite ve altyapısının geliştirilmesinde kütüphanelerin rolü büyüktür. Bu doğrultuda Koleksiyonun artırılması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. Buna bağlı olarak yapılan harcamalarla kütüphane koleksiyonu artırılmıştır. Eğitim, öğretim, araştırma ve yayın sayısında artış sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<ul style="list-style-type: none"><li>- Veri tabanları sayısındaki artış ve çeşitlilik nedeniyle seçimi konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bunun çözümü olarak deneme erişimindeki kullanım istatistikleri ve veritabanını kullanan üniversitelerin istatistikleri dikkate alınmaktadır.</li><li>-Tek E-dergi alımlarında e-kaynak veri tabanlarında olup olmadığı kontrol edilmekte, böylelikle çift alımlar önlenmektedir.</li><li>- Özellikle e-kaynak veri tabanlarında, tek e-dergi alımlarında fiyatlandırma döviz kuru üzerinden yapıldığı için döviz kurlarındaki dalgalanmalar ödeme planlarımızı ve bütçemizi etkilemektedir. Ek ödenek talep etmek zorunda kalınmaktadır.</li><li>- Bazı e-kaynak veri tabanı firmaları belli bir tarihte ödeme istemekte, (bütçe yılının ilk aylarında) ödenmemesi durumunda firma faiz uygulamaktadır. Ocak ayında ve sonrasında açılan ödenekle öncelikli olarak bu veri tabanları ödenmektedir.</li><li>- Aralık ayı sonunda kesinleşen kütüphane bütçesine göre gelecek yıl ödeme planlaması yapılmakta, döviz artışı tahminine göre bazı az kullanılan veri tabanları iptal edilmek zorunda kalınmaktadır.</li><li>- Basılı yayın temininin ihale usulü ile yapılması yayın sağlamada zorluklar yaşanmasına, ihale sürecinin uzun sürmesi de temin edilen yayınların okuyucuya sunulmasında gecikmelere yol açmaktadır.</li><li>E-kaynakların çoğunlukla döviz cinsi üzerinden ödenmesi ve döviz artışının tahmin edilenden fazla yükselmesi basılı kaynak alımını etkilemekte, basılı kaynaklarda hedeflenen sayıya ulaşamamaktadır.</li></ul>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Her yılsonu abone olduğumuz veri tabanlarının kullanım istatistikleri incelenerek, kullanım ve maliyet analizi yapılmakta, analiz sonucuna göre veri tabanı aboneliğine devam edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir.					

**3. Proje No : 2020H03-152775(Eğitim-Yükseköğretim Sektörü)****Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Alımı**

2020 yılında yayın alımları için 300.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmış ve 298.393,00 TL'si harcanmıştır. Yıl içinde ödeneğin % 99' u kullanılmıştır.

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
Proje No	2020H03-152775				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-152775				300.000,00	300.000,00
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Alımı					
Sektör/Altsektör	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM					
Proje Amacı	Eğitim Öğretim Hizmet Kalitesini Artırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Etüt Proje					
Fiziki hedef	%100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		300.000,00			300.000,00	
<b>Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama</b>						
	Cari Fiyatlarla			2020Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		298.393,00			298.393,00	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli olan etüt proje ihtiyaçlarının giderilmesi sonucunda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetinin aksamadan yürütülmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eğitimde Hizmet Kalitesinin Arttırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Dış Hekimliği Fakültesi Eğitim Bloğu ve Hastane Bloğu Mimari Avan - Kesin projeleri yaptırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	2021 yatırım programı çerçevesinde cari giderler belirlenerek proje kapsamında yatırım ödeneği talep etmek.					

**4. Proje No : 2020I00-136261 (Sağlık Sektörü)**  
**Proje Adı : Muhtelif İşler**

#### 1-Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

Sağlık sektöründeki büyük onarım ihtiyaçları için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2.617.000,00 TL ödeneği Likit imkânları ve 6.310.000,00 TL projeler arası aktarım ile projeye tahsis edilerek kullanılabilir tutar 9.427.000,00 TL' ye çıkarılmıştır. Projede yer alan ödeneğin % 76,19'luk kısmı olan 7.182.842,38 TL harcanmıştır.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2020I00-136261			500.000,00	9.427.000,00	
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	SAĞLIK					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Fiziki Hedef	% 100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		9.427.000,00			9.427.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		7.182.842,38			7.182.842,38	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmış olması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Büyük Onarım işi için sağlanmış olan ödenekle Eski Poliklinik Binası Zemin Kat Düzenlemesi ile Kafeterya Yapımı ve Laboratuvar Düzenlemesi işleri yapılmıştır. İki poliklinik arasına Çelik Taşıyıcılı Sundurma Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır. Hastanemiz Doğrudan Temin Yolu ile Basınçlı Hava Santral Merkezi Kurulumu için gerekli olan, Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ile Hastane Ana Bina Acil Serviste Tomografi Odası, Acil Servis 3 adet izolasyon kabini, yoğun bakım mahalline alüminyum bölmeden izolasyon kabini ve 3 adet fotoselli kapı, ana bina ön giriş yan bahçesine ve yeni poliklinik binası ön girişine demir korkuluk ve bahçe düzenlemesi, morfoloji binasında yeni çocuk servisi mahal düzenlemesi, hastanenin kafeterya bölümüne dekor duvar tuğla, ana bina ön giriş yan bahçesine sundurma yapım işleri alımlarını gerçekleştirmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	2021 yatırım programı çerçevesinde cari giderler belirlenerek proje kapsamında yatırım ödeneği talep etmek.					

## 2-Makine Teçhizat Karakteristiđi

Hastanemiz Makine Teçhizat alımı ihtiyaçlarında kullanmak üzere projeye 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.10.390.000,00 TL projeler arası aktarım ile eklenerek toplam ödeneđi 11.890.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Projede yer alan ödeneđin % 98,86'lık kısmı olan 11.754.858,26 TL 'si harcanmıştır.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
Proje No	2020I00-136261				Yatırım Programına Alınış Deđerleri	Revize Edilmiş Son Deđerler
Proje No	2020I00-136261				1.500.000,00	11.890.000,00
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektor	SAĐLIK					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiđi	Makine-Teçhizat					
Fiziki hedef	%98,86					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		11.890.000,00			11.890.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		11.754.858,26			11.754.858,26	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Sađlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülebilirliđinin sađlanmış olması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sađlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliđinin artırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Makine Teçhizat alım için sađlanan bütçe ile, 19. Madde Açık İhale yolu ile 1 adet En Az 384 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı alımı, Perkütan Nefroskopi Seti, ACT Cihazı, Cerrahi El Aletleri, 21.b Pazarlık yolu ile Acil-Ambulans alımı, Full Otomatik Endoskop Yıkama Makinesi, Ameliyat Masası Bacak Pozisyonlandırma Botu, KBB Cerrahi El Aletleri, Beyin Cerrahisi Yüksek Devirli Cerrahi Motor, Ortopedi Tur Ve Shaver Sistemi, 22.D Doğrudan Temin Yolu İle Ozon Cihazı, Telefon Santrali, El Dopleri, Ultrason Cihazı, Çalışma Koltuđu, Aseptizör Cihazı, Defibrilatör Cihazı alımı yapılmıştır. Makine Teçhizat alımı için 170.000 TL. 6.7. Büyük Onarım Bütçesinden 6.1. Makine Teçhizat Bütçesine aktarım yapılmış olup, 12.025.000,00 TL bütçenin 11.890.858,26 TL'si harcanmış olup 135.141,74 TL 2021 yılına devretmiştir. 2020 Yılı Sađlık Sektörü için ayrılan bütçenin toplamda %88'i kullanılmış olup, Büyük Onarım için ayrılan bütçenin %75'i, Makine Teçhizat alımı için ayrılan bütçenin %98'i kullanılmıştır.					
Geleceđe İlişkin Çıkarılan Dersler	2021 yatırım programı çerçevesinde Makine Teçhizat ihtiyaçları belirlenerek proje kapsamında yatırım ödeneđi talep etmek.					

**5. Proje No : 2015I00-2387(Sağlık Sektörü)**  
**Proje Adı : Poliklinik Ek Bina İnşaatı**

### 1-Hastane İnşaatı Karakteristiği

Sağlık sektöründeki büyük onarım ihtiyaçları için 17.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 16.700.000,00 TL si projeler arası aktarım ile başka projeye tahsis edilerek kullanılabilir tutar 800.000,00 TL' ye düşürülmüştür. Projede yer alan ödeneğin % 96,05'lik kısmı olan 768.385,00 TL harcanmıştır.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
				Yatırım Programına Alınmış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2015I00-2387			17.500.000,00		800.000,00
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	SAĞLIK					
Proje Amacı	Sağlık Hizmetinde Kaliteyi Arttırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Hastane İnşaatı					
Fiziki Hedef	% 100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2015-2020					
Proje Sözleşme Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		800.000,00			800.000,00	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		768.385,00			768.385,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmış olması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Projemiz 2015 yılında yatırım programına girmiştir.2016 yılında ihalesi yapılarak 2016-2020 yılları içinde inşaatı tamamlanmıştır. Poliklinik ek binamız 2020 yılında hizmete açılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	2021 yatırım programı çerçevesinde ihtiyaçları belirlenerek proje kapsamında yatırım ödeneği talep etmek.					

**6. Proje No : 2016K12-2858(Teknolojik Araştırma Sektörü)**  
**Proje Adı : Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi**

Teknolojik araştırma sektörüne 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılından 1.000.000,00 TL devreden ödenekle projenin toplam ödeneği 1.010.000,00 TL ye yükselmiştir. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %100 'dür.

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2016K12-2858			10.000,00		1.010.000,00
Proje Adı	Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi					
Sektör/Altsektör	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma					
Fiziki Hedef	% 100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2016-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma
		1.010.000,00			1.010.000,00	
<b>Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama</b>						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		1.010.000,00			1.010.000,00	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin araştırma geliştirme hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve kalitesinin artırılması .					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Araştırma geliştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğinin artırılması..					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2020 Yılında Kocaeli Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Geliştirme ve GMP Laboratuvarı Projesinde (KOU-DEKART) kullanılmak 1 kalem makine-teçhizat alım yapılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje süresini tamamlamış olup Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi ni sağlık alanında araştırma geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.					

**7. Proje No : 2020K12-151192 (Teknolojik Araştırma Sektörü)**  
**Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

Teknolojik araştırma sektörüne 1.905.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %100 'dür.

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2016K12-151192			1.905.000,00		1.905.000,00
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Altsektör	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma					
Fiziki Hedef	% 100					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı(Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		1.905.000,00			1.905.000,00	
<b>Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama</b>						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamuşlaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		1.905.000,00			1.905.000,00	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından onaylanan projelerin desteklenerek araştırma geliştirme hizmetinin aksamadan yürümesi ve kalitesinin artırılması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Araştırma geliştirme hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğinin artırılması.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bilimsel araştırma projeleri yürütücüleri tarafından talep edilen çeşitli cihaz,hizmet vb.alımlar gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Araştırma geliştirme faaliyetlerine aktarılan bütçenin imkanlar dahilinde artırılarak daha fazla proje desteklemek.					

2020 yılı içerisinde aşağıdaki tabloda detayları verilen projelerde tamamlanmıştır.

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2020H03-151143	Muhtelif İşler (Makine Teç.)	Kocaeli Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2	2020H03-151143	Muhtelif İşler (Bilgi. Teknolojileri)	Kocaeli Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3	2020H03-151143	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Kocaeli Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4	2020H03-151135	Muhtelif İşler (Yayın Alımı)	Kocaeli Üniversitesi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
5	2020H03-152775	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kocaeli Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
6	2020I00-136261	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Kocaeli Üniversitesi	Araştırma ve Uygulama Hastanesi
7	2020I00-136261	Muhtelif İşler (Makine Teç.)	Kocaeli Üniversitesi	Araştırma ve Uygulama Hastanesi
8	2015I00-2387	Poliklinik Ek Bina	Kocaeli Üniversitesi	Araştırma ve Uygulama Hastanesi
9	2016K12-2858	Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kocaeli Üniversitesi	Özel Kalem
10	2020K12-151192	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Kocaeli Üniversitesi	Özel Kalem

## IV. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

1. Personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlikler
2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması da ihalelerin geç sonuçlanmasını beraberinde getirmekte ve işlerin zamanında tamamlanmasını engellemektedir.
3. 4734 sayılı kamu ihale yasası ile düzenleyici yönetmelikleri kapsamlı işlerde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanmakta ve planlanan ödenekler dahilinde işlerin bitirilmesi ön görülmektedir. Ancak uygulama da, özellikle yıllara sari işlerde takip eden yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda gerçekleşmemekte, bunlara ilaveten yasanın ön gördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme bedeline eklendiğinde sözleşme takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve süre revizyonlarına gidilmektedir. İlave süreler ve bütçedeki daralmalar ileriki planlamaları aksatmakta hedeflerden uzaklaşmaktadır. Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır.
4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Ancak, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan Orta Vadeli Program'da kurumların yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurumsal amaç ve hedefler göz ardı edilmektedir. Bu durumda; Yatırım ödenekleri Orta Vadeli Program ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulduğundan süreler uzamakta ve yatırımlar planlanan sürede bitirilememektedir.
5. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin kurum teklifi dikkate alınmadan vize edilmekte, bu durum planlama sorunlarına neden olmaktadır.

## V. Öneriler

1. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bürokratik işlemlerin minimuma indirgenmesi gerekmektedir.
2. Umuttepe merkez yerleşkesi başta olmak üzere bütün yerleşkelerde yer alan Klima Santralleri, soğutma sistemleri, su deposu, arıtma tesisi, asansör, trafolar, jeneratörler, kızgın su üreten ısı merkezi ve eşanjör daireleri, yağmursuyu hattı ve ızgaraların temizlenmesi, kanalizasyon hattı, galeri hattı(kızgın su gidiş- dönüş hattı, yangın hattı, temiz su hattı), telefon hatları, otomatik sulama sistemleri, otomasyon sistemleri, kültür ve kongre merkezlerinde yer alan ses ışık sahne sistemleri gibi önemli ve hayati cihazların yetkin kişilerce periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Birimlerimiz bünyesinde bahsi geçen cihazların verimli ve ekonomik olarak işletilmesini yapabilecek yeterli uzman elemanların olmayışı ve kadromuzun bu konuda yetersiz olması nedeniyle bu tür teknik hizmetlerin “ hizmet satın alma” yolu ile yaptırılması zorunlu olup, gerekli harcamalar için ihtiyaç duyulan ödeneğin yıl içerisinde temini yerine yıllık bütçe içerisinde yer almasının sağlanması önem arz etmektedir.
3. Yangın, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda ilk müdahalenin yapılabilmesi için sivil savunma uzmanlığı biriminin donanımlı bir şekilde aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu oluşum içerisinde ihtiyaç halinde hemen devreye alınması için el altında bulundurulacak itfaiye araçlarının ve sepetli eklemeli hidrofik platformlu aracın bulundurulması acil müdahalelerde önem arz etmektedir.
4. Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında basit olarak acil müdahale gerektirecek arızaların giderilmesine yönelik o birim içerisinde görevlendirilmiş bulunan teknisyenlerin bu hizmetleri yapabilecek şekilde donanımlarının temin edilmesi ve bu elemanların sorunu tespit ve anında müdahale edecek şekilde aktif olarak görev almasının sağlanması, önem arz etmektedir.

# EK 1 2020 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu

## 2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) DÖNEM=IV

2020 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bin TL

Kuruluş Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ															
Sektör Adı : EĞİTİM															
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredisi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1		2020H03-152775	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli		700	-	300	-				298
2		2020H03-150815	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Kocaeli		6.000	-	2.000	-				2.000
3		2008H03-151874	Derslik ve Merkezi Birimler (Sosyal Donatı 761)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Kocaeli		4.150	-	2.000	-				1.999
4		2020H03-151143	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli		6.000	-	7.700	-				7.540
5		2020H03-151135	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli		3.800	-	3.000	-				2.997
<b>TOPLAM</b>								<b>20.650</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.834</b>

## 2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) DÖNEM=IV

Bin TL

Kuruluş Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı : SAĞLIK																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredisi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredisi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1		2015I000-2387	Poliklinik Ek Bina	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli	-	74.587	70.587	-	-	800	-				768
2		2020I000-136261	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli	-	16.000	-	-	-	18.700	+	2.617			18.938
<b>TOPLAM</b>								<b>90.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.500</b>	<b>+</b>	<b>2.617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.706</b>

## 2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) DÖNEM=IV

Kuruluş Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı : DKH-SOSYAL																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredisi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredisi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1		2020K12-151192	Rektörlük Bilişim Araştırma Projeleri <sup>a</sup>	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli		1.905	-	-	-	1.905	+				1.905
2		2016K12-2858	Klinik Deneyel Uygulama ve Araştırma Merkezi <sup>a</sup>	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kocaeli		16.275	16.265	-	-	10	+	1.000			1.010
<b>TOPLAM</b>								<b>18.180</b>	<b>16.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.915</b>	<b>+</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.915</b>

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BÜTÇE TÜRÜ: DÖNER SERMAYE

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2020 YILI PROGRAM ÖDENEK			2020 YILI REVİZE ÖDENEK			2020 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
				DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM
				KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK	
TARIM															
MADENCİLİK															
İMALAT															
ENERJİ															
ULAŞTIRMA-HAB.															
TURİZM															
KONUT															
EĞİTİM															
SAGLIK	1		500						500			500			
D.KAMU HİZM.															
İKTİSADİ															
SOSYAL															
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BÜTÇE TÜRÜ: ÖZEL BÜTÇE

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2020 YILI PROGRAM ÖDENEK			2020 YILI REVİZE ÖDENEK			2020 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
				DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM
				KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK	
TARIM															
MADENCİLİK															
İMALAT															
ENERJİ															
ULAŞTIRMA-HAB.															
TURİZM															
KONUT															
EĞİTİM	5		20.650					15.000			15.000				14.834
SAGLIK	2		90.587			70.587		19.500			22.117				19.706
D.KAMU HİZM.															
İKTİSADİ															
SOSYAL	2		18.180			16.265		1.915			2.915				2.915
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>129.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.852</b>	<b>0</b>	<b>36.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.455</b>

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BÜTÇE TÜRÜ: İCMAL

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2020 YILI PROGRAM ÖDENEK			2020 YILI REVİZE ÖDENEK			2020 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
				DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM
				KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK	
TARIM															
MADENCİLİK															
İMALAT															
ENERJİ															
ULAŞTIRMA-HAB.															
TURİZM															
KONUT															
EĞİTİM	5		20.650					15.000			15.000				14.834
SAGLIK	2		90.587			70.587		20.000			22.617				19.706
D.KAMU HİZM.															
İKTİSADİ															
SOSYAL	2		18.180			16.265		1.915			2.915				2.915
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>129.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.852</b>	<b>0</b>	<b>36.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.455</b>
